PROGRAMA DE TRABAJO

Diseño y Construcción de Obras de Captación, Conducción y las Actividades Arqueológicas para el Proyecto Sistema de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque y Comunidades Costeras (PAACUME)

EDT	Nombre de tarea	Plazo (meses)
0	OBRAS DE CONDUCCION Y ARQUEOLOGÍA	
1	FIRMA DE CONTRATO	0
2	ORDEN DE INICIO	0
3	MOVILIZACIÓN	1
4	PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA	41
5	VÍAS DE ACCESO	7
6	LÍNEA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA - TRANSMISIÓN	6
7	INSTALACIONES PROVISIONALES	3
8	HABILITACIÓN DE ESCOMBRERAS	2
9	TOMA DE AGUAS	11
10	TUBERÍA FORZADA	11
11	CAUDAL DE COMPENSACIÓN ECOLOGICA	11
12	EXCAVACIONES I ETAPA CM	4
13	TUNEL	5
14	CANAL TEMPORAL DE RIEGO (A. ARRIBA OT)	5
15	CANAL DE DESVÍO - CAMARA DISIPADORA	6
16	DESVÍO CANAL OESTE	1

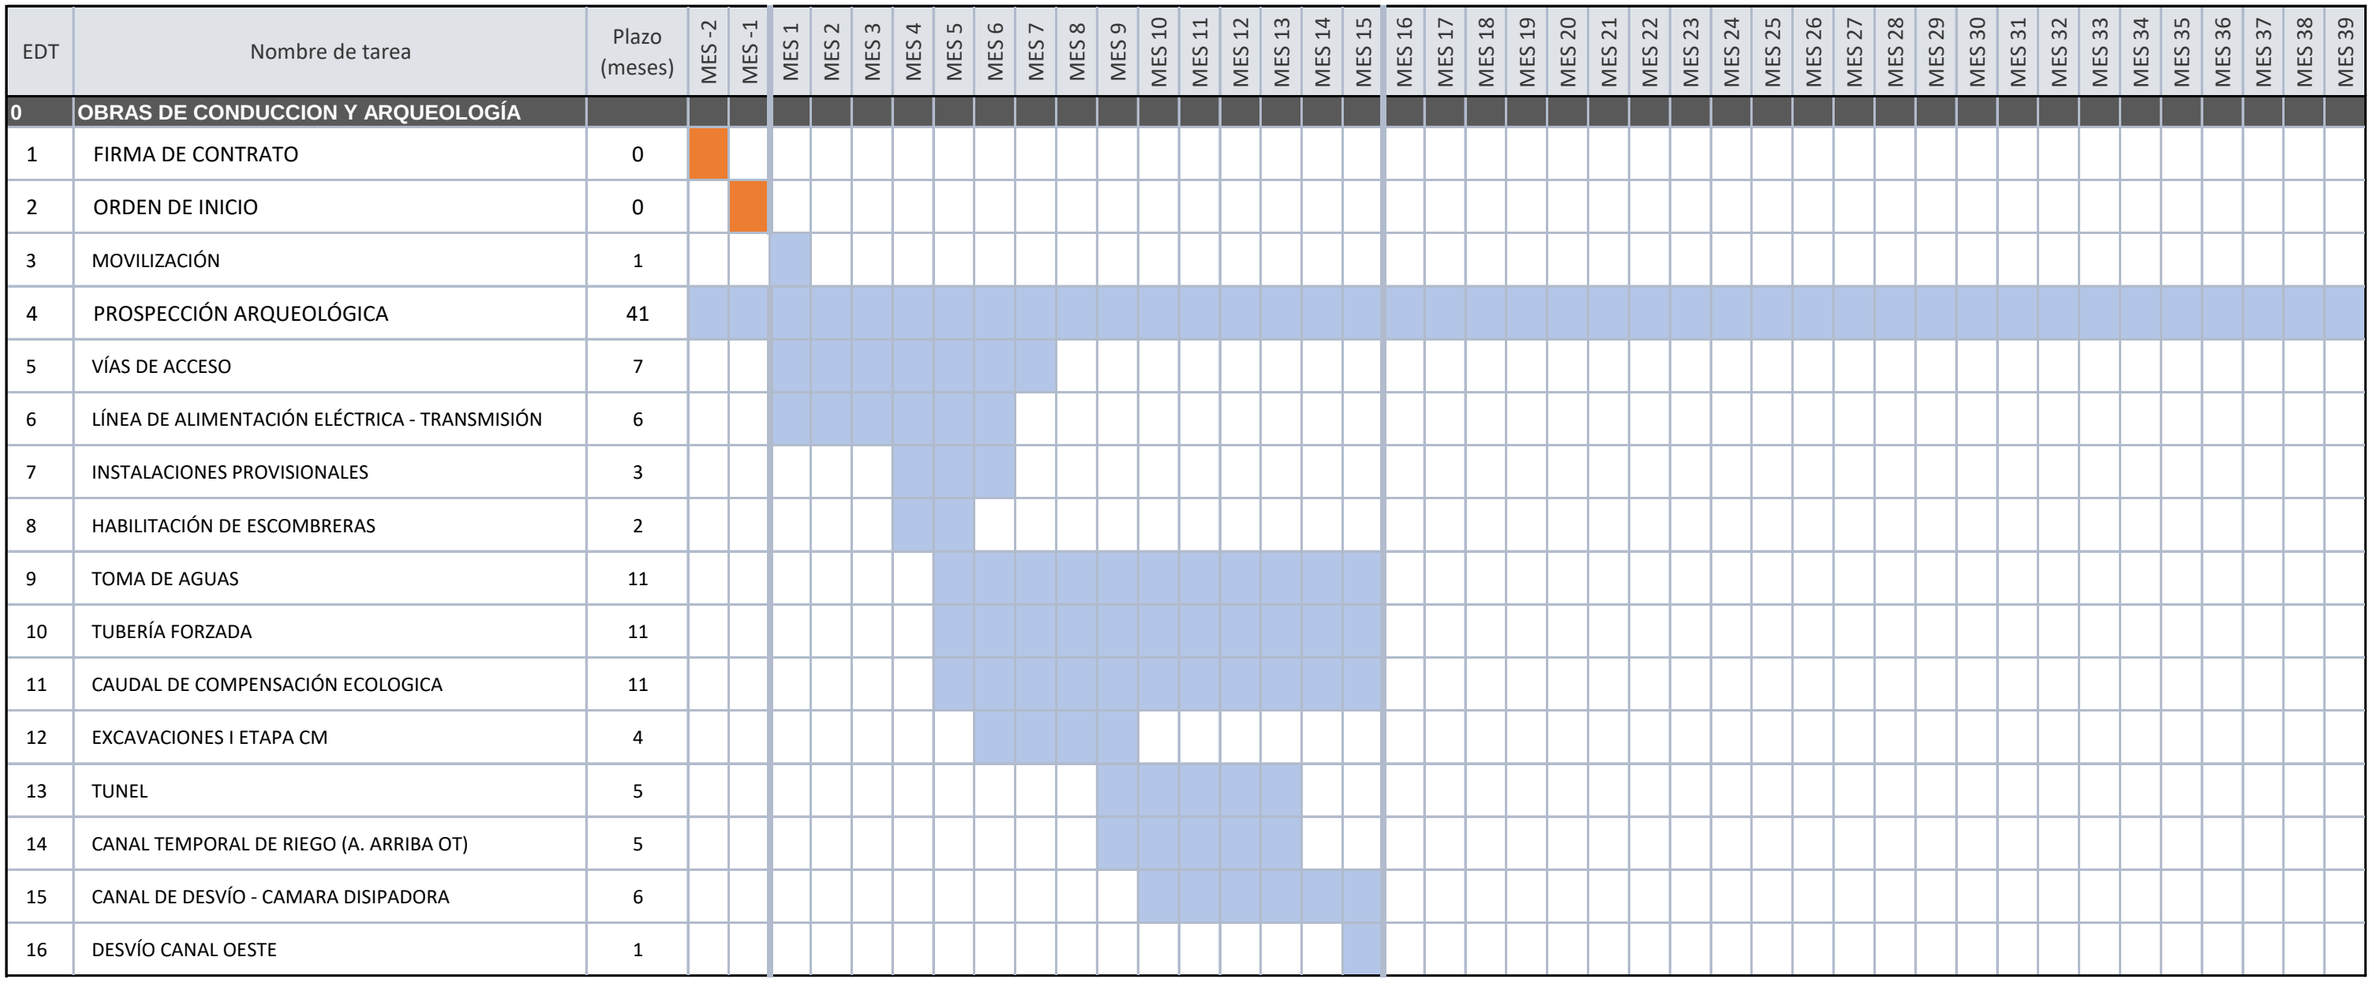

FECHA: MAYO 2025
